

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

FONREGION 2020
Informe de Proyectos Autorizados en 2020

Fecha de corte: 31/12/2020

No	FOLIO SEFIR23	Entidad	Municipio	Proyecto	Ejecutora	Meses	Fecha Radicación Recurso	Periodo	Contrato	Fecha de		Proveedor y / o contratista	Importe Autorizado				Importe Contratado				Indirectos	Importe Comprometido con indirectos				Avance Financiero				Avance Físico	Fecha de término	Observaciones	
										Inicio de contrato	Termino de contrato o comento		Federal	Estatal	Municipal	Total Autorizado	Federal	Estatal	Municipal	Total Contratado		Federal	Estatal	Municipal	TOTAL COMPROMETIDO	Federal	Estatal	Municipal	TOTAL				
																																	Federal
1	1262898	Michoacán de Ocampo	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FELIPE DE LOS HERREROS, MICHOACAN	CEAC	10	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-003/2020	12/10/2020	12/04/2021	PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V.	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	12,302,415.85	0.00	0.00	12,302,415.85	212,110.62	12,514,526.47	0.00	0.00	12,514,526.47	8,539,579.70	0.00	0.00	8,539,579.70	37%	12/04/2021	OBRA EN PROCESO	
2	12622341	Michoacán de Ocampo	TLAZAZALCA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLAZAZALCA MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-004/2020	12/10/2020	12/04/2021	GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	22,807,000.00	0.00	0.00	22,807,000.00	22,304,170.45	0.00	0.00	22,304,170.45	384,554.66	22,688,725.11	0.00	0.00	22,688,725.11	12,640,280.31	0.00	0.00	12,640,280.31	30%	12/04/2021	OBRA EN PROCESO	
3	12628744	Michoacán de Ocampo	NAHUATZEN	TERMINACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-005/2020	13/10/2020	13/04/2021	SHAVISIA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	18,993,000.00	0.00	0.00	18,993,000.00	18,550,178.09	0.00	0.00	18,550,178.09	319,830.66	18,870,008.75	0.00	0.00	18,870,008.75	12,366,210.80	0.00	0.00	12,366,210.80	32%	13/04/2021	OBRA EN PROCESO	
4	12618218	Michoacán de Ocampo	BUENAVISTA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN DEL ESTADO DE MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-006/2020	13/10/2020	13/04/2021	PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V.	24,612,824.00	0.00	0.00	24,612,824.00	24,155,083.59	0.00	0.00	24,155,083.59	416,466.96	24,571,550.55	0.00	0.00	24,571,550.55	14,402,066.43	0.00	0.00	14,402,066.43	30%	13/04/2021	OBRA EN PROCESO	
5	12617246	Michoacán de Ocampo	PATZCUARO	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRITO	CEAC	10	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-007/2020	29/10/2020	26/04/2021	LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V.	10,000,000.00	10,005,000.00	0.00	20,005,000.00	9,413,490.20	9,418,197.52	0.00	18,831,687.72	162,301.57	19,000,000.00	9,418,197.52	0.00	0.00	19,000,000.00	4,733,005.49	4,709,099.06	0.00	9,442,104.55	5%	26/04/2021	OBRA EN PROCESO
6	12617330	Michoacán de Ocampo	IXTLAN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN IXTLAN DE LOS HERVORES MICHOACAN	CEAC	20	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-008/2020	29/10/2020	26/04/2021	LA MITRAVI, S.A. DE C.V.	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	13,000,000.00	9,377,769.19	2,813,327.10	0.00	12,191,096.29	161,685.63	12,352,781.92	2,813,327.10	0.00	0.00	12,352,781.92	4,755,892.06	1,406,663.54	0.00	6,162,555.60	5%	26/04/2021	OBRA EN PROCESO
7	12628927	Michoacán de Ocampo	CHURUMUCO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA, TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-009/2020	24/11/2020	27/05/2021	ZOLA ESPINO LOPEZ	43,923,907.00	0.00	0.00	43,923,907.00	43,134,321.89	0.00	0.00	43,134,321.89	743,695.21	43,878,017.10	0.00	0.00	43,878,017.10	21,749,776.40	0.00	0.00	21,749,776.40	15%	27/05/2021	OBRA EN PROCESO	
8	12628622	Michoacán de Ocampo	ZITACUARO	REHABILITACION DE LA PTAR Y CONSTRUCCION DE EMISOR EN EL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-012/2020	08/12/2020	31/05/2021	CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	39,460,500.00	10,489,500.00	0.00	49,950,000.00	38,663,596.98	10,277,665.02	0.00	48,941,262.00	666,613.74	49,607,875.74	10,277,665.02	0.00	0.00	49,607,875.74	19,400,500.70	5,138,832.51	0.00	24,539,333.21	0%	24/06/2021	OBRA EN PROCESO (Se realizó el primer mes de calendario a pago de anticipo)
9	12628663	Michoacán de Ocampo	SALVADOR ESCALANTE	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA CLARA DEL COBRE, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-010/2020	24/11/2020	27/05/2021	GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V.	31,500,000.00	9,000,000.00	0.00	40,500,000.00	30,927,328.99	8,836,379.71	0.00	39,763,708.70	533,229.81	40,296,938.51	8,836,379.71	0.00	0.00	40,296,938.51	15,548,261.24	4,418,189.86	0.00	19,966,451.10	0%	04/07/2021	OBRA EN PROCESO (Se realizó el primer mes de calendario a pago de anticipo)
10	12628805	Michoacán de Ocampo	HUETAMO	CONSTRUCCION DE LA PTAR Y DE EMISOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ EN MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-011/2020	24/11/2020	27/05/2021	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V.	49,950,022.40	0.00	0.00	49,950,022.40	48,985,769.74	0.00	0.00	48,985,769.74	844,582.24	49,830,351.98	0.00	0.00	49,830,351.98	26,411,123.87	0.00	0.00	26,411,123.87	6%	27/05/2021	OBRA EN PROCESO	
													263,847,253.40	32,494,500.00	0.00	296,341,753.40	257,814,124.97	31,345,569.35	0.00	289,159,694.32	4,445,071.10	262,259,196.07	31,345,569.35	0.00	293,604,765.42	140,546,697.00	15,672,784.97	0.00	156,219,481.97				

al primer mes del calendario inicia al mes siguiente de la ministración.

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

FONREGION 2020
Informe de Proyectos Autorizados en 2020

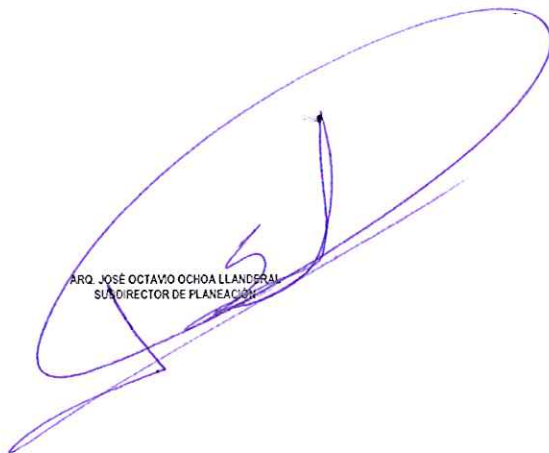
Fecha de corte: 31/12/2020

No	FOLIO SEFIR23	Entidad	Municipio	Proyecto	Ejecutora	Meses	Fecha Radicación Recurso	Periodo	Contrato	Fecha de		Proveedor y/o contratista	Importe Autorizado				Importe Contratado				Indirectos	Importe Comprometido con Indirectos				Avance Financiero				Avance Físico	Fecha de término	Observaciones
										Inicio de contrato	Termino de contrato o convenio		Federal	Estatal	Municipal	Total Autorizado	Federal	Estatal	Municipal	Total Contratado		Federal	Estatal	Municipal	TOTAL COMPROMETIDO	Federal	Estatal	Municipal	TOTAL			
1	1262868	Michoacán de Ocampo	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FELIPE DE LOS HERREROS, MICHOACAN	CEAC	10	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRAS/LFH-003/2020	12/10/2020	12/04/2021	PROSECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V.	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	12,302,415.95	0.00	0.00	12,302,415.85	212,110.62	12,514,526.47	0.00	0.00	12,514,526.47	8,539,579.70	0.00	0.00	8,539,579.70	37%	12/04/2021	OBRA EN PROCESO
2	12622841	Michoacán de Ocampo	TLAZAZALCA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLAZAZALCA MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRAS/LFH-004/2020	12/10/2020	12/04/2021	GERAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	22,807,000.00	0.00	0.00	22,807,000.00	22,304,170.45	0.00	0.00	22,304,170.45	384,554.66	22,688,725.11	0.00	0.00	22,688,725.11	12,640,290.31	0.00	0.00	12,640,290.31	30%	12/04/2021	OBRA EN PROCESO
3	12628744	Michoacán de Ocampo	NAHUATZEN	TERMINACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRAS/LFH-005/2020	13/10/2020	13/04/2021	SHAVISIA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	18,993,000.00	0.00	0.00	18,993,000.00	18,550,178.09	0.00	0.00	18,550,178.09	319,830.66	18,870,008.75	0.00	0.00	18,870,008.75	12,366,210.80	0.00	0.00	12,366,210.80	32%	13/04/2021	OBRA EN PROCESO
4	12619218	Michoacán de Ocampo	BUENAVISTA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN DEL ESTADO DE MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRAS/LFH-006/2020	13/10/2020	13/04/2021	PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V.	24,612,824.00	0.00	0.00	24,612,824.00	24,155,083.59	0.00	0.00	24,155,083.59	418,466.96	24,571,550.55	0.00	0.00	24,571,550.55	14,402,068.43	0.00	0.00	14,402,068.43	30%	13/04/2021	OBRA EN PROCESO
5	12617245	Michoacán de Ocampo	PATZCUARO	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRITO	CEAC	10	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRAS/LFH-007/2020	29/10/2020	29/04/2021	LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V.	10,000,000.00	10,005,000.00	0.00	20,005,000.00	9,413,430.20	9,418,197.52	0.00	18,831,627.72	162,361.57	9,575,791.77	9,418,197.52	0.00	18,993,989.29	4,730,005.49	4,709,099.06	0.00	9,442,104.55	5%	25/04/2021	OBRA EN PROCESO
6	12617330	Michoacán de Ocampo	ITLAN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ITLAN DE LOS HERVORES MICHOACAN	CEAC	20	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRAS/LFH-008/2020	29/10/2020	29/04/2021	LA MTRAVISA, S.A. DE C.V.	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	13,000,000.00	9,377,789.19	2,813,327.10	0.00	12,191,096.29	161,695.63	9,539,484.82	2,813,327.10	0.00	12,352,781.92	4,755,802.06	1,456,663.54	0.00	6,182,555.60	5%	25/04/2021	OBRA EN PROCESO
7	12628927	Michoacán de Ocampo	CHURUMUCO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA, TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRAS/LFH-009/2020	24/11/2020	27/05/2021	ZOLA ESPINO LOPEZ	43,923,907.00	0.00	0.00	43,923,907.00	43,134,321.89	0.00	0.00	43,134,321.89	743,695.21	43,878,017.10	0.00	0.00	43,878,017.10	21,749,776.40	0.00	0.00	21,749,776.40	15%	27/05/2021	OBRA EN PROCESO
8	12628622	Michoacán de Ocampo	ZITAUARO	REHABILITACION DE LA PANTAR Y CONSTRUCCION DE EMISOR EN EL MUNICIPIO DE ZITAUARO MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRAS/LFH-010/2020	06/12/2020	31/05/2021	CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	39,460,500.00	10,469,500.00	0.00	49,930,000.00	38,663,596.98	10,277,665.02	0.00	48,941,262.00	666,613.74	39,330,210.72	10,277,665.02	0.00	49,607,875.74	19,400,500.70	5,138,832.51	0.00	24,539,333.21	0%	24/05/2021	OBRA EN PROCESO (Se está efectuando el pago de anticipo)
9	12628683	Michoacán de Ocampo	SALVADOR ESCALANTE	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA CLARA DEL COBRE, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRAS/LFH-011/2020	24/11/2020	27/05/2021	GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V.	31,500,000.00	9,000,000.00	0.00	40,500,000.00	30,927,328.99	8,836,379.71	0.00	39,763,708.70	533,229.81	31,460,558.60	8,836,379.71	0.00	40,296,938.31	15,548,251.24	4,418,189.86	0.00	19,966,451.10	0%	04/07/2021	OBRA EN PROCESO (Se está efectuando el pago de anticipo)
10	12628606	Michoacán de Ocampo	HUETAMO	CONSTRUCCION DE LA PANTAR Y DE EMISOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ EN MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRAS/LFH-011/2020	24/11/2020	27/05/2021	HM IMPULSORA MEXICANA HM AMK, S.A. DE C.V.	49,950,022.40	0.00	0.00	49,950,022.40	48,965,769.74	0.00	0.00	48,965,769.74	844,582.24	49,830,351.98	0.00	0.00	49,830,351.98	26,411,123.87	0.00	0.00	26,411,123.87	5%	27/05/2021	OBRA EN PROCESO

a/ El primer mes del calendario inicia al mes siguiente de la ministración

263,847,253.40 32,494,500.00 0.00 296,341,753.40 257,814,124.97 31,345,569.35 0.00 289,159,694.92 4,445,071.10 262,259,196.07 31,345,569.35 0.00 293,604,765.42 140,545,697.00 15,672,784.97 0.00 156,219,481.97


ING. SALVADOR HORTA SANTANA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION


ARQ. JOSÉ OCTAVO OCHOA LLANDERAL
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION


C.P. LUIS JAVIER OCHOA BASILLAS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO


L.A.E. GERMAN TIZA FERNANDEZ
 COORDINADOR GENERAL
