

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

FONREGION 2020
Informe de Proyectos Autorizados en 2020

Fecha de corte: 30/06/2021

No	FOLIO SEFIR23	Entidad	Municipio	Proyecto	Ejecutora	Meses	Fecha Radicación Recurso	Periodo	Contrato	Fecha de		Proveedor y / o contratista	Importe Autorizado				Importe Contratado				Indirectos	Importe Comprometido con indirectos				Avance Financiero				Avance Físico	Fecha de término	Observaciones		
										Inicio de contrato	Termino de contrato o convenio		Federal	Estatal	Municipal	Total Autorizado	Federal	Estatal	Municipal	Total Contratado		Federal	Estatal	Municipal	TOTAL COMPROMETIDO	Federal	Estatal	Municipal	TOTAL					
																																	Federal	Estatal
1	1262898	Michoacán de Ocampo	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FELIPE DE LOS HERREROS, MICHOACAN	CEAC	10	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-003/2020	12/10/2020	12/04/2021	PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V.	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	12,302,415.85	0.00	0.00	12,302,415.85	212,110.62	12,514,526.47	0.00	0.00	12,514,526.47	12,514,526.45	0.00	0.00	12,514,526.45	100%	16/03/2021	OBRA TERMINADA		
2	12622341	Michoacán de Ocampo	TLAZAZALCA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLAZAZALCA MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-004/2020	12/10/2020	12/04/2021	GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	22,807,000.00	0.00	0.00	22,807,000.00	22,304,170.45	0.00	0.00	22,304,170.45	384,554.66	22,688,725.11	0.00	0.00	22,688,725.11	22,688,725.07	0.00	0.00	22,688,725.07	100%	08/04/2021	OBRA TERMINADA		
3	12628744	Michoacán de Ocampo	NAHUATZEN	TERMINACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-005/2020	13/10/2020	13/04/2021	SHAVISIA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	18,993,000.00	0.00	0.00	18,993,000.00	18,550,178.09	0.00	0.00	18,550,178.09	319,830.66	18,870,008.75	0.00	0.00	18,870,008.75	18,870,008.73	0.00	0.00	18,870,008.73	100%	06/04/2021	OBRA TERMINADA		
4	12618218	Michoacán de Ocampo	BUENAVISTA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN DEL ESTADO DE MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-006/2020	13/10/2020	13/04/2021	PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V.	24,612,824.00	0.00	0.00	24,612,824.00	24,155,083.59	0.00	0.00	24,155,083.59	416,466.96	24,571,550.55	0.00	0.00	24,571,550.55	24,571,550.50	0.00	0.00	24,571,550.50	100%	17/03/2021	OBRA TERMINADA		
5	12617246	Michoacán de Ocampo	PATZCUARO	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRITO	CEAC	10	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-007/2020	29/10/2020	26/04/2021	LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V.	10,000,000.00	10,005,000.00	0.00	20,005,000.00	9,413,490.20	9,418,197.52	0.00	18,831,687.72	162,301.57	9,575,791.77	9,418,197.52	0.00	0.00	18,993,989.29	8,541,156.56	8,383,045.44	0.00	16,924,202.00	100%	08/06/2021	OBRA TERMINADA	
6	12617330	Michoacán de Ocampo	IXTLAN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN IXTLAN DE LOS HERVORES MICHOACAN	CEAC	20	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-008/2020	29/10/2020	26/04/2021	LA MITRAVI, S.A. DE C.V.	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	13,000,000.00	9,377,769.19	2,813,327.10	0.00	12,191,096.29	161,685.63	9,539,454.82	2,813,327.10	0.00	0.00	12,352,781.92	9,539,446.35	2,813,324.55	0.00	12,352,779.90	100%	02/05/2021	OBRA TERMINADA	
7	12628927	Michoacán de Ocampo	CHURUMUCO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA, TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-009/2020	24/11/2020	27/05/2021	ZOILA ESPINO LOPEZ	43,923,907.00	0.00	0.00	43,923,907.00	43,134,321.89	0.00	0.00	43,134,321.89	743,695.21	43,878,017.10	0.00	0.00	43,878,017.10	40,440,185.29	0.00	0.00	40,440,185.29	60%	SIN DEFINIR	OBRA EN SUSPENSIÓN TEMPORAL		
8	12628622	Michoacán de Ocampo	ZITACUARO	REHABILITACION DE LA PTAR Y CONSTRUCCION DE EMISOR EN EL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-012/2020	08/12/2020	31/05/2021	CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	39,460,500.00	10,489,500.00	0.00	49,950,000.00	38,663,596.98	10,277,665.02	0.00	48,941,262.00	666,613.74	39,330,210.72	10,277,665.02	0.00	0.00	49,607,875.74	31,614,966.18	8,226,789.89	0.00	39,841,756.07	80%	SIN DEFINIR	OBRA EN SUSPENSIÓN TEMPORAL	
9	12628663	Michoacán de Ocampo	SALVADOR ESCALANTE	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA CLARA DEL COBRE, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-010/2020	24/11/2020	27/05/2021	GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V.	31,500,000.00	9,000,000.00	0.00	40,500,000.00	30,927,328.99	8,836,379.71	0.00	39,763,708.70	533,229.81	31,460,558.80	8,836,379.71	0.00	0.00	40,296,938.51	29,302,380.20	8,219,970.47	0.00	37,522,358.67	98%	04/07/2021	OBRA EN PROCESO (Se realizó diferimiento de plazo de acuerdo a pago de anticipo)	
10	12628805	Michoacán de Ocampo	HUETAMO	CONSTRUCCION DE LA PTAR Y DE EMISOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ EN MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGIÓN/OBRA/ LPN-011/2020	24/11/2020	27/05/2021	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. DE C.V.	49,950,022.40	0.00	0.00	49,950,022.40	48,985,769.74	0.00	0.00	48,985,769.74	844,582.24	49,830,351.98	0.00	0.00	49,830,351.98	47,434,626.02	0.00	0.00	47,434,626.02	95%	12/07/2021	OBRA EN PROCESO (Se realizó convenio en tiempo)		
													263,847,253.40	32,494,500.00	0.00	296,341,753.40	257,814,124.97	31,345,569.35	0.00	289,159,694.32	4,445,071.10	262,259,196.07	31,345,569.35	0.00	293,604,765.42	245,517,571.35	27,643,130.35	0.00	273,160,701.69					

al El primer mes del calendario inicia al mes siguiente de la ministración.

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

FONREGION 2020
Informe de Proyectos Autorizados en 2020

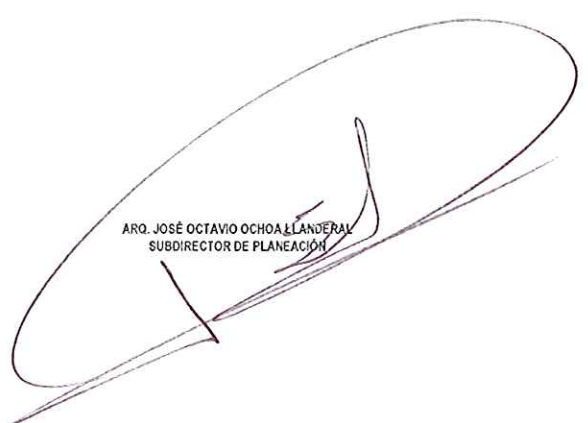
Fecha de corte: 30/06/2021

No	FOLIO SEFIR23	Entidad	Municipio	Proyecto	Ejecutora	Meses	Fecha Radicación Recurso	Periodo	Contrato	Fecha de		Proveedor y/o contratista	Importe Autorizado				Importe Contratado				Indirectos	Importe Comprometido con Indirectos				Avance Financiero				Avance Físico	Fecha de Terminación	Observaciones
										Inicio de contrato	Termino de contrato o convenio		Federal	Estatal	Municipal	Total Autorizado	Federal	Estatal	Municipal	Total Contratado		Federal	Estatal	Municipal	TOTAL COMPROMETIDO	Federal	Estatal	Municipal	TOTAL			
1	1202808	Michoacán de Ocampo	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FELIPE DE LOS HERREROS, MICHOACAN	CEAC	10	14/09/2020	Octubre 2020 a Junio 2021	CEAC/FONREGIÓN/OSBRM LFN 003/2020	12/10/2020	12/04/2021	PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V.	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	12,302,415.65	0.00	0.00	12,302,415.65	212,110.92	12,514,526.47	0.00	0.00	12,514,526.47	12,514,526.45	0.00	0.00	12,514,526.45	100%	16/03/2021	OBRA TERMINADA
2	12022341	Michoacán de Ocampo	TLAZAZALCA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLAZAZALCA MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre 2020 a Septiembre 2021	CEAC/FONREGIÓN/OSBRM LFN 004/2020	12/10/2020	12/04/2021	GRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	22,807,000.00	0.00	0.00	22,807,000.00	22,304,170.45	0.00	0.00	22,304,170.45	384,554.66	22,688,725.11	0.00	0.00	22,688,725.11	22,688,725.07	0.00	0.00	22,688,725.07	100%	05/04/2021	OBRA TERMINADA
3	1202974	Michoacán de Ocampo	NAHUATZEN	TERMINACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre 2020 a Septiembre 2021	CEAC/FONREGIÓN/OSBRM LFN 005/2020	13/10/2020	13/04/2021	SHAVISIA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	18,993,000.00	0.00	0.00	18,993,000.00	18,550,178.09	0.00	0.00	18,550,178.09	319,830.66	18,870,008.75	0.00	0.00	18,870,008.75	18,870,008.73	0.00	0.00	18,870,008.73	100%	05/04/2021	OBRA TERMINADA
4	12018218	Michoacán de Ocampo	BUENAVISTA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN DEL ESTADO DE MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre 2020 a Septiembre 2021	CEAC/FONREGIÓN/OSBRM LFN 006/2020	13/10/2020	13/04/2021	PROYECTOS Y OBRAS ORSE, S.A. DE C.V.	24,612,824.00	0.00	0.00	24,612,824.00	24,155,063.55	0.00	0.00	24,155,063.55	415,468.96	24,571,550.55	0.00	0.00	24,571,550.55	24,571,550.50	0.00	0.00	24,571,550.50	100%	17/03/2021	OBRA TERMINADA
5	12017240	Michoacán de Ocampo	PATZCUARO	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRITO	CEAC	10	14/09/2020	Octubre 2020 a Junio 2021	CEAC/FONREGIÓN/OSBRM LFN 007/2020	25/10/2020	23/04/2021	LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V.	10,000,000.00	10,005,000.00	0.00	20,005,000.00	9,413,430.20	9,415,127.52	0.00	18,828,557.72	162,301.57	9,575,731.77	9,418,127.52	0.00	18,993,859.29	8,541,156.56	8,383,045.44	0.00	16,924,202.00	100%	05/05/2021	OBRA TERMINADA
6	12017330	Michoacán de Ocampo	IXTLAN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN IXTLAN DE LOS HERVORES MICHOACAN	CEAC	20	14/09/2020	Octubre 2020 a Junio 2021	CEAC/FONREGIÓN/OSBRM LFN 008/2020	25/10/2020	25/04/2021	LA MTRAVIS A. DE C.V.	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	13,000,000.00	9,377,769.15	2,813,327.10	0.00	12,191,096.25	161,685.63	9,539,454.82	2,813,327.10	0.00	12,352,781.92	9,539,445.35	2,813,324.55	0.00	12,352,770.90	100%	02/05/2021	OBRA TERMINADA
7	12021927	Michoacán de Ocampo	CHURUMUCO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA, TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre 2020 a Octubre 2021	CEAC/FONREGIÓN/OSBRM LFN 009/2020	24/11/2020	27/05/2021	ZOLA ESPINO LOPEZ	43,923,907.00	0.00	0.00	43,923,907.00	43,134,321.85	0.00	0.00	43,134,321.85	743,695.21	43,878,017.10	0.00	0.00	43,878,017.10	43,443,155.29	0.00	0.00	43,443,155.29	60%	SIN DEFINIR	OBRA EN SUSPENSIÓN TEMPORAL
8	12019022	Michoacán de Ocampo	ZITAUARO	REHABILITACION DE LA PTAR Y CONSTRUCCION DE EMISOR EN EL MUNICIPIO DE ZITAUARO MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre 2020 a Octubre 2021	CEAC/FONREGIÓN/OSBRM LFN 010/2020	06/12/2020	31/05/2021	CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	39,460,500.00	10,489,500.00	0.00	49,950,000.00	38,663,596.58	10,277,665.02	0.00	48,941,261.60	666,613.74	39,330,210.72	10,277,665.02	0.00	49,607,875.74	31,614,566.18	8,225,789.65	0.00	39,841,356.83	60%	SIN DEFINIR	OBRA EN SUSPENSIÓN TEMPORAL
9	12020683	Michoacán de Ocampo	SALVADOR ESCALANTE	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA CLARA DEL COBRE, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre 2020 a Octubre 2021	CEAC/FONREGIÓN/OSBRM LFN 011/2020	24/11/2020	27/05/2021	GRUPO CONSTRUCTOR MLA NAVARRETE, S.A. DE C.V.	31,500,000.00	9,000,000.00	0.00	40,500,000.00	30,927,328.99	8,836,379.71	0.00	39,763,708.70	533,229.81	31,400,598.60	8,836,379.71	0.00	40,236,978.31	29,302,350.20	8,219,570.47	0.00	37,521,920.67	56%	14/11/2021	OBRA EN PROCESO (se está esperando el pago de la cuenta por el trabajo)
10	12020605	Michoacán de Ocampo	HUETAMO	CONSTRUCCION DE LA PTAR Y DE EMISOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ EN MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre 2020 a Octubre 2021	CEAC/FONREGIÓN/OSBRM LFN 012/2020	24/11/2020	27/05/2021	HM MPULSORA MEXICANA HM MEX S.A. DE C.V.	49,950,022.40	0.00	0.00	49,950,022.40	48,965,729.74	0.00	0.00	48,965,729.74	844,522.21	49,810,251.95	0.00	0.00	49,810,251.95	47,434,028.02	0.00	0.00	47,434,028.02	56%	12/07/2021	OBRA EN PROCESO (se está esperando el pago)

a/ El primer mes del calendario inicia al mes siguiente de la ministración

263,847,253.40 32,424,500.00 0.00 296,341,753.40 257,814,124.97 31,345,569.35 0.00 289,159,604.92 4,445,071.10 252,259,156.07 31,345,569.35 0.00 289,604,765.42 245,517,571.35 27,643,130.35 0.00 273,150,701.69


ING. SALVADOR HORTA SANTANA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION


ARO. JOSÉ OCTAVIO OCHOA LLANERA
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION


C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO


C.E. ANGELICA PEREZ GOMEZ
 COORDINADORA GENERAL
